



AVREO



Association des Volontaires pour la Récupération des Enfants Orphelins
Abandonnés Malnutris



Ville/Goma C/KARISIMBI Q/Mabanga Nord Av SALONGO N°4

E-mail : avreok@gmail.com / avreo64@gmail.com

Téléphone : +243 99 03 13 581

RAPPORT TRIMESTRIEL DES ACTIVITES REALISEES EN TERRITOIRE DE RUTSHURU

***PROJET: « Prévention et Assistance aux
survivant(e)s des violences sexuelles dans le
Territoire de Rutshuru au Nord Kivu. En RD
Congo» de Juillet à Septembre 2017. Projet
N°788.388***

Octobre 2017

1. CONTEXTE : OBSERVATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

1.1. SITUATION POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE

La RD Congo a vu le début de l'année 2017 commencé dans une ambiance politique (Concertation nationale), tout à fait particulière d'une année dite électorale et cela accompagnés des multiples slogans des partisans d'un ou d'un autre parti politique, des confessions religieuses et ceux des partenaires internationaux toujours au sujet du processus électoral en 2017. Etant tant entendus, ce sujet pousse la population toute entière vers une attention médiatique du jour au lendemain sur l'évolution de la question. En analysant le discours tenu par la majorité Présidentiel devant le congrès, le peuple congolais n'espère plus au tenu des élections à la fin 2017 comme prévu dans les différents accords. Par ailleurs, au niveau du rayon d'action du projet, quelques faits récupérés par les politiciens dans la plus part vivant dans la capitale et Villes du Pays en défaveur de la paix dans leur milieu d'origine, ces politiciens pris comme tireur de ficelle dans la situation d'incitation à la haine d'une communauté contre une autre autour de leur intérêt propre. La population de Territoire de Rusthuru toujours expose par l'insécurité dans plusieurs tronçons et tensions dans certains Villages. Ainsi les enjeux politiques (électoraux) du moment pourraient aussi influencer cet aspect pour plusieurs raisons. Toutefois, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'Etat dans cette contrée, certains postes inoccupés des quelques agglomérations ont eu des nouveaux animateurs, et par la même occasion de la nomination de ces chefs locaux, l'autorité Provinciale en passage dans le Territoire a profité pour passer les messages de paix entre la population et les élus du terroir d'une part et vers les communautés vivant dans le Territoire de Rutshuru d'autres part. Cela a été accompagné par les médias du milieu pour une large diffusion.

Les Territoires de Masisi et de Rusthuru dans le Nord-Kivu ont connus et subissent encore des conflits entre les multiples acteurs armés, ce qui entraîne des déplacements importants de la population. Depuis plusieurs décennies, le Nord-Kivu est affecté par les mouvements des groupes armés, ayant des conséquences sur la protection des civils et sur l'accès aux services de bases minimum. La dégradation de la situation sécuritaire enregistre une dégradation marquée par des besoins humanitaires de plus en plus urgents et des problématiques de protection qui demandent des actions de prévention et de réponse coordonnées au sein de la communauté locale.

Parlant de la cohésion sociale au sein de Territoire de Rusthuru dont est composé de plusieurs tribus ; nous pouvons citer : Nande, Hutu, Hunde, Tutsi, Twa et à cela s'ajoute aussi d'autres tribus voyageurs car le Rusthuru est considéré comme une plaque commerciale avec sa structure géographique notamment son relief. Ainsi plusieurs violations des droits humains, les tueries et des pillages à répétitions avec toute ses conséquences sur la population de Rusthuru.

1.2. CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Pendant cette période, la situation économique est difficile à comprendre, cette situation est dictée d'une part pour les atrocités qui occasionnée de déplacement de la population provenance de la chefferie de Bwito et de Lubero Sud qui sont regroupés dans les familles d'accueil dans le contre à vouloir se protéger contre les attaques des groupes armés auto défenses de leur commun autres (Nyatura, FDL, MAI MAI).

D'une autre part le changement climatique qui a perturbé cette saison culturale, a tel enseigne que la population a perdu toute la production et la situation est vraiment chaotique, le signe visible de la famine. Ces deux situations citées – ci haut est à l'origine de la hausse de prix dans l'entité sans oublier aussi la situation politique qui fait qu'il a la dévaluation monétaire, un dollar qui était échangé à 900 FC est monté à 1500 FC. C'est ainsi que pour le moment un mesure de haricot qui coûtait 500 FC est double de 1500 FC soit à 1800FC. Selon les qualités sont une augmentation de plus les maïs, la farine de maniocs et autres produits de 1ères nécessité. Les paysans n'ont pas l'espoir de trouver la semence pour la grande saison qui se pointe à l'horizon et cette situation continue, la rentrée des classes pour les enfants risque de connaître de perturbation car l'économie des paysans est lancée dans son champ. Les enfants ont les risques d'être autant de la malnutrition car il n'y a pas

la production pour les familles d'accueil et les déplacés n'ont pas d'assistance et aussi inflation momentanée dictée par la politique actuelle met la vie de la population dans l'instabilité économique.

Le Territoire de Rusthuru reste l'un de meilleure voie d'alimenter la ville de Goma, par des denrées alimentaires et autres produits des premières nécessités à provenance de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays. Plus le Territoire est affecté par l'insécurité et des tensions ethniques dans la zone cela auraient une manque a gagné par la population de Rusthuru pour leur survie.

1.3. RISQUES LIÉS AU CONTEXTE

La communauté locale est victime de la situation sécuritaire préoccupante, mais également du contexte politique, économique qui ne facilitent pas l'amélioration souhaitée de leur condition de vie.

Sur le plan politique les députés élus s'intéressent partiellement à la misère de la population ainsi ils font souvent recours à cette dernière que pendant la période électorale. Par conséquent, certaines solutions souhaitées par les représentants du peuple attendent les décisions du gouvernement central qui n'interviennent qu'avec un long processus occasionnant ainsi le non avancement dans les prises de décisions contre les actions de violations des droits humains au niveau local.

La situation sécuritaire ; au courant de ce trimestre en Territoire de Rutshuru, nous avons enregistré plusieurs violations des droits humains dont nous pouvons citer à titre d'exemple :

KIWANJA : De la rentrée scolaire année 2017-2018, les enfants des déplacés cantonnés à l'église catholique et reçus dans les familles d'accueil à Kiwanja n'ont pas eu accès au cours ce lundi, 04 septembre. Causes, leurs parents craignent les faire inscrire n'ayant pas des moyens pour la prise en charge. Inscrire l'enfant à l'école en suite manquer les moyens de lui procurer les fournitures scolaires. Telle est la crainte des parents des enfants déplacés venus de la chefferie de Bwito territoire de Rutshuru et du territoire de Lubero. Ces enfants courent le risque de persister dans la rue et devenir chege ou mai bobo du moins si aucune assistance ne s'occasionne, dit le chargé de sécurité du camp SIMO MUKUNGU. Dans le cas contraire, JANVIER MUNYAKABANZE le secrétaire de déplacés résidant dans les familles d'accueil suggère que si le gouvernement restaure la paix dans ces entités en insécurité et qu'ils obtiennent accès la bas ils seront capables de scolariser leurs enfants.. Jusqu'à présent ces parents restent préoccupés vu que leurs enfants risquent de rater cette année scolaire et cela à cause de non implication des autorités, disent certains déplacés trouvés au camp.

Environ quinze personnes toutes de l'agglomération de Kiwanja, hommes et femmes confondus, ont été enlevées lundi 4 Septembre dernier vers seize heures dans leurs champs situés à l'Ouest de Kahunga, cinq kilomètres au Nord de Kiwanja. Selon nos sources, ces preneurs d'otage arrêtaient ces victimes une à une de retour de leurs champs et les faisaient asseoir par terre. Et quand ils ont atteint un nombre estimé à une quinzaine, ils les ont emportées en brousse. D'autres sources renseignent néanmoins que ces preneurs d'otage avaient évidemment arrêté quinze personnes mais ils auraient relâchés neuf parmi elles, pour ne rester qu'avec six. Et ce sont ces six qui seraient emportées en brousse. Mardi après-midi, ces hommes armés ont conditionné la libération des otages par des rançons à chacune des familles des victimes.

BWITO : Découverte macabre ce lundi 4 septembre matin à Kishishe chefferie de Bwito. Un homme a été trouvé mort dans la rivière Nyabihanda, à l'est de la localité de Kishishe. Selon des sources à Kishishe, cet homme avait été enlevé, lui et sa fille, par un groupe de cinq hommes. Ces ravisseurs dont on ignore l'identité s'étaient divisés en deux groupes de 3 et 2 hommes. Les uns avaient gardé la fille et les autres étaient partis avec son père. Ces 3 hommes étaient ensuite revenus annoncer à la fille que son père s'était évadé, demandant à la fille de s'en aller. Lundi matin, les proches sont allés chercher le pauvre homme. Il avait été atrocement tué à l'arme blanche. Selon notre source, ses bourreaux l'avaient égorgé et arraché sa langue dans la rivière Nyabihanda.

Le village de Kishishe, en chefferie de Bwito, se vide de ses habitants. Ils fuient l'incertitude qui s'installe à la suite des événements meurtriers du samedi le 9 septembre là-bas.

Le président du Barraza intercommunautaire condamne ces récentes tueries et incendies des maisons dans le Bwito. Sabena Antoine rappelle aux membres des différents groupes armés que seules les FARDC ont la mission de sécuriser les civils et leurs biens. Ce président du Barraza intercommunautaire appelle également les membres de différentes communautés à ne pas se mêler dans les conflits entre groupes armés.

BUKOMA : Un présumé bandit armé a été appréhendé dimanche 3 septembre vers 21 heures au quartier Rusaka 3 à Kinyandoni, une dizaine de km de Kiwanja sur la route Ishasha. Selon un habitant de Kinyandoni, cet homme faisait partie d'une bande qui tentait de démolir une maison la nuit. Les militaires FARDC et policiers en patrouille leur avaient ouvert le feu. Certains membres de cette bande se sont sauvés dans la nature. Un seul, celui qui était armé, en est sorti avec

des blessures par balles. Il avait cherché cachette chez une femme de Kinyandoni. Notre source indique que les militaires et policiers en patrouille ont suivi les traces du sang. Ils ont ainsi retrouvé cet homme et son arme chez cette femme. Les deux sont détenus par les FARDC à Kinyandoni, nous indique-t-on.

VITSHUMBI : Au moins 10 pirogues et des piroguiers de Vitshumbi, Kyavinyonge et Kamandi ou Taliha ont été détenus par les maimai mardi 5 sept à Kyanika, sur la cote ouest du lac Edouard. Ces pirogues assurent la liaison entre les pirogues de pêche qui restent longtemps sur le lac et le rivage à Vitshumbi emmenant les produits de pêche et d'autres relient différents côtiers du lac Edouard. L'activisme de ces maimai de différents groupes sur le lac Edouard décourage certains pêcheurs et affecte ainsi le vécu quotidien à Vitshumbi.

NYAMILIMA : Les habitants de Nyamilima qualifient d'instable la situation sécuritaire de leur entité. Pour ces congolais, cette situation est le résultat de l'activisme des groupes armés qui opèrent dans la zone. Selon les habitants de Nyamilima, cette situation leur rend la vie difficile car ils ne peuvent plus accéder à leurs champs. Ces derniers demandent aux autorités compétentes à tout mettre en œuvre afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du territoire de Rutshuru.

La société civile de Nyamilima Alphonse KAMBALE confirme cette situation, le président pense qu'au-delà des opérations en cours, le dialogue avec les groupes armés afin de comprendre leur cahier de charge s'avère indispensable pour rétablir la paix et la sécurité dans la zone.

Le multiple cas de Kidnapping dans la Chefferie et quelques coins de notre rayon d'action a laissé signaler 56 cas de Kidnapping enregistrés à la courdes ce 3ème trimestre. Cet état de chose a joué un peu sur l'effectif des cas incidents identifiés par les Maisons d'écoute, ainsi que sur le système de supervision des activités sur les axes identifiés rouges ou verts.

Il se constate une incidence élevée des cas des IST, suite au paramètre sécuritaire et au traitement des victimes et leur maintien prolongé sur le lieu d'enlèvement (Kidnapping). Ces faits sont à la base des complications dues aux viols diagnostiqués par les médecins chez plusieurs bénéficiaires. Cela a eu de répercussions négatives sur la santé de la population, ainsi que sur l'effectif des bénéficiaires qui devraient recevoir des Kit PEP.

2. AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Matrice de suivi du cadre logique du projet au niveau des résultats (*outputs*)

Logique d'intervention du projet (à copier depuis le cadre logique)	Valeur cible planifiée (à copier depuis	Valeur cible atteinte (1 ^{er} et	Budget planifié pour le résultat attendu	Dépenses réelles (en %) pour le	Explications des écarts	Décision de pilotage
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------

	le POA ou le plan de S&E, le cas échéant)	3 ^{ème} trimestre)		résultat attendu		
Résultat attendu 1: 108 séances de sensibilisations communautaires organisées 2017			450\$	100%	Il n'y a pas d'écart.	Poursuivre les activités de sensibilisation par le dialogue communautaire.
Indicateur de résultat 1.1 : Identifier et signer les protocoles d'accord avec les OB impliquées dans la sensibilisation	03 OB, 03 protocoles	03 OB, protocoles			Pas d'écart	Maintien du partenariat avec les OB
Indicateur de résultat 1.2 : Planification des séances de sensibilisation	36 séances de sensibilisation seront organisées en 2017	27 séances			Pas d'écart. Car toute les séances prévus ont été organisées et réalisées.	Planifier les autres séances de sensibilisation en T4.
Indicateur de résultat 1.3 : Préparation des thèmes et impression des matériels de sensibilisation.	500 dépliant 25T-shirts	500 dépliant 25 T-shirts			Pas d'écart. Car tous les dépliant et T-Shirts ont été imprimés et distribués	Les bénéficiaires de T-shirts devront les gardes en bon père de famille pour la pérennisation de la visibilité d'AVREO dans le milieu du projet.
Indicateur de résultat 1.4 : Préparation des participants	1800 membres de communautés à préparer en 2017.	1350 membres de communautés ont été préparés			Pas d'écart.	Préparer d'autres participants jusqu'à fin 2017
Indicateur de résultat 1.5 : Animation de la séance de sensibilisation	36 séances prévues en 2017.	27 séances animées			Pas d'écart. Car toutes les séances prévues durant la période ont été animées	Animer les autres séances prévues pour la période suivante
Indicateur de résultat 1.6 : Evaluation des activités	36 séances évaluations des activités prévues	27 séances d'évaluations			Pas d'écart.	Suivi régulier des OB dans l'évaluation des activités.

	en 2017.					
Indicateur de résultat 1.7 : Production des rapports de sensibilisation	36 rapports seront produits en 2017	27 rapports			27 rapports de sensibilisation sur 36 rapports (prévus toute l'année) ont été réalisés.	Suivi des OB sur l'élaboration des rapports
Résultat attendu 2 : 72 émissions radiodiffusées animées à la radio « RACOU » (2 émission par mois).			90 \$	100%	Pas d'écart	Maintien de la Radio
Indicateur de résultat 2.1: Identification de la radio communautaire à utiliser	1 radio identifiée depuis 2015	1 radioidentifiée depuis 2015.			Pas d'écart.	Identifier une autre radio dans la zone pour une grande, large couverture médiatique
Indicateur de résultat 2.2: Signature du protocole d'accord avec la radio communautaire identifiée	1 protocole signé	1 protocole signé			Pas d'écart, car 1 radio prévue, 1 radio identifiée.	Proposition de signer le protocole d'accord avec la radio qui sera identifié
Indicateur de résultat 2.3 : Formulation des thèmes pour les émissions radio	24 thèmes d'émission seront formulés en 2017.	18 thèmes d'émission formulés			Pas d'écart. Car 18 thèmes formulés pour le 3 ^{ème} trimestre sur 24 thèmes prévus pour l'année.	Formuler des thèmes d'émission pour la période suivante.
Indicateur de résultat 2.4 : Préparer le conducteur de l'émission radio	24 conducteurs d'émissions seront préparés	18 conducteurs préparés			Pas d'écart. 18 conducteurs d'émission prévue jusqu'au 3 ^{ème} trimestre ont été préparé sur 24 thèmes d'émission à préparer cette année.	Préparer d'autres conducteurs d'émission pour la période suivante
Indicateur de résultat 2.5 : Animation des émissions radio	24 émissions radio seront animées.	18 d'émissions animées.			Pas d'écart.	Animer d'autres émissions radio pour la période suivante
Indicateur de résultat 2.6: Evaluer et établir le rapport d'émissions radio.	24 émissions radio seront évaluées et rapportés.	18 rapports émissions radio.			Pas d'écart.	Evaluer et Produire des rapports d'écoute pour la prochaine période.
Indicateur de résultat 2.7 : rapport d'écoute	24 rapports seront écoute.	18 rapports d'écoute			Pas d'écart.	Produire d'autres rapports d'écoute pour la prochaine

						période.
Résultat attendu 3 : Organisation 108 séances échanges en focus group jusqu'à fin 2017			225 \$	100%	Pas d'écart	Poursuite des séances de focus groupe durant la période restante (T4)
Indicateur de résultat 3.1 : Identifier 25 participants par séance d'échange en focus group	900 participants seront identifiés.	675 participants identifiés			Pas d'écart. Sur 900 participants à identifier toute l'année 2017 ; 675 participants ont été identifiés jusqu'au 3 ^{ème} trimestre.	Identifier d'autres participants pour les prochaines périodes de la vie du projet
Indicateur de résultat 3.2 : Planification de 108 séances échanges en focus group (en raison d'une séance par site et par mois)	36 séances en focus group sont planifiées	27 séances en focus group planifiées			Pas d'écart. Sur 36 séances en focus group prévues toute l'année ; 27 séances en focus group ont été planifiées au 3 ^{ème} trimestre du 2017.	Planifier d'autres séances pour le T4.
Indicateur de résultat 3.3 : Préparation des thèmes à développer lors des échanges	36 fiches de thème de préparation et élaborer	27 fiches de préparation			Pas d'écart. car 36 fiches prévues pour l'année, 27 fiches ont été préparées pour le 3 ^{ème} trimestre	Préparer d'autres thèmes durant la période suivante.
Indicateur de résultat 3.4 : Préparation des participants	900 participants sont préparés	675 participants préparés			Sur 900 participants à préparer pour 1 année ; 675 participants ont préparés jusqu'aux 3 ^{ème} trimestres.	Préparer d'autres participants pour le T4.
Indicateur de résultat 3.5 : Animation de la séance d'échange en focus group	36 séances seront animées	27 séances animées			Sur 36 séances prévues pour être animées pour l'année, 27 séances ont été animées jusqu'au 3 ^{ème} trimestre.	Animer d'autres séances pour les prochaines périodes
Indicateur de résultat 3.6 : Evaluation des activités	36 activités seront évaluées	27 activités ont été évaluées			Sur 36 activités prévues pour être évaluées pour l'année ; 27 activités ont été évaluées jusqu'au 3 ^{ème} trimestre.	Evaluer d'autres séances pour la prochaine période.
Indicateur de résultat 3.7 : Production des rapports des séances d'échanges en focus group.	36 rapports seront produits	27 rapports ont été produits			27 rapports ont été produits jusqu'au 3 ^{ème} trimestre. sur 36 rapports attendus pour 1 année 2017	Produire les rapports pour le T4.
Résultat attendu 5 :144 séances d'encadrement en faveur de 20 jeunes vulnérables d'ici 2017.			00 \$	00 %	Pas d'écart	Continuer à observer l'amélioration socio- économique de ces 20 jeunes encadrés et

						plaider pour l'augmentation de l'effectif des jeunes
Indicateur de résultat 5.10 Assurer le suivi des activités génératrices d'emploi.	36 suivis assurés	27 suivis assurés sur 36 prévues pour l'année			Les suivis est assuré après l'installation des jeunes sur le marcher d'emploi	Continuité des suivis des activités des jeunes dans leur milieu
Indicateur de résultat 5.11 : Produire les rapports d'activités avec les histoires de succès en annexe.	36 rapports produits	27 rapports produits sur les 36 prévus			Les rapports d'activités et les histoires de succès produit	Produire d'autres rapports en T4.
Résultat attendu 6 :l'assistance psychologique est apportée à au moins 486 bénéficiaires (336 SVS, 60 enfants issus du viol et 90 autres vulnérables), par 3 Agents psychosociaux et 4 animateurs dans le Rutshuru d'ici Décembre 2017			1900\$	102%	La formation des prestataires a eu lieu en 2 ^{ème} trimestre du 2016.	Apporter de l'Assistance psychosociale aux bénéficiaires
Indicateur de résultat 6.1 : Recruter 3 APS et 4 Animateurs	3 APS et 3 Animateurs	3 APS et 3Animateurs			Les APS et Animateurs ont été recruté en 2015	Maintenir les agents après leur évaluation.
Indicateur de résultat 6.2 : Organiser une séance de formation des prestataires à Kiwanja en faveur de 3 APS, 4 animateurs et 3 IT ou ITA la PEC des SVS, la protection de victimes, et les lois réprimant les VS (Loi sur les violences sexuelles).	3 APS 3 Animateurs et 3 IT ou ITA formés	Une formation organisée en 2016			Pas d'écart. Car la formation prévue a été organisée en 2016.	Continuité des formations dans d'autres thématiques associant au SGBV.
Indicateur de résultat 6.3 : Louer 3 Maisons d'écoutes	3 maisons d'écoute louées	3 maisons d'écoute louées			Pas d'écart. Toutes les maisons d'écoute prévues ont été louées	Maintenir les maisons d'écoute
Indicateur de résultat 6.4 : Réhabiliter 3 Maisons d'écoute	3 maisons d'écoute	3 maisons d'écoute réhabilitées			Pas d'écart. Toutes les maisons d'écoute prévues ont été réhabilitées	Bien garder les maisons d'écoutes Réhabiliter
Indicateur de résultat	3 maisons	3 maisons			Pas d'écart.	Assurer une bonne

6.5 :Equiper 3 Maisons d'écoute en mobiliers et fournitures	d'écoute équipées	d'écoute équipées en mobiliers et fournitures				maintenance des équipements et fournitures des maisons d'écoute.
Indicateur de résultat 6.6 : Identifier au moins 486 bénéficiaires du projet.	138bénéficiaires prévus pour l'année 2017.	126 bénéficiaires ont été identifiés pour la période			Pas d'écart car tous les 39 cas prévus jusqu'au 3 ^{ème} Trimestre ont été identifiés.	Augmenter le nombre des bénéficiaires suite au manque d'autres intervenants dans le rayon d'action et la montée de violation des droits humains malgré le réaménagement budgétaire en T2.
Indicateur de résultat 6.7 : Ecouter au moins 486 Bénéficiaires	138bénéficiaires	126 bénéficiaires sont écoutés			126 cas identifiés sont écoutés dont parmi eux 04 cas sont prise en chargé psychiquement au centre de sante mental « <i>Tulizo Letu</i> »	Ecouter d'autres bénéficiaires en T4
Indicateur de résultat 6.8 : Mener 108 visites de suivi des cas et visites à domicile	36 visites	27 visites à domicile			Pas d'écart. 27 visites effectuées.	Multiplier les visites à domicile pour le 4 ^{ème} trimestre.
Indicateur de résultat 6.9 : Organiser 108 séances de médiation familiales en cas de rejet de survivantes.	36 séances de médiation	12séances de médiations familiales			12 séances de médiation ont été effectuées, ce qui montre la baisse de décimation, de rejet des SVS par les siens.	Organiser d'autres séances de médiation familiale pour les cas en nécessité en T4.
Résultat attendu 7 : l'assistance médicale est fourni à 486 bénéficiaires (336 SVS, 60 enfants issus du viol et 90 autres vulnérables), parmi lesquelles 18 cas des fistules dus aux viols seront pris en charge dans le Rutshuru d'ici Décembre 2017.			12224\$	59.5 % soit 7280\$	L'achat des Kit PEP prévu au 4 ^{ème} trimestre.	Assurer une prescription rationnelle pour la prise en charge médicale suite à la hausse et le débordement des cas, vue l'absence des intervenants dans le rayon d'action pour une meilleure prise

					en charge.
Indicateur de résultat 7.1 : Identification des structures sanitaires partenaires (CS Buturande, CS Kinyandoni, CS Rubare et l'Hôpital de Kyeshero)	3 C.S et 1 hôpital	3 C.S et 1 hôpital identifié		Les 3 CS prévus ont été identifiés.	Maintien des structures sanitaires partenaires identifiées. Un centre de sante mentale a été identifié pour la prise en chargé psychique de cas compliqué.
Indicateur de résultat 7.2 : Signer les protocoles avec la ZS de Rutshuru pour renforcer les supervisions des CS partenaires	2 protocoles	2 protocoles avec le BCZ de Rutshuru et 1 Hôpital de kyeshero)		Pas d'écart. 2 protocoles prévus, dont 1 protocole signé avec le BCZ par un système d'accord de signature du protocole pour chaque 6moisle signé avec Hôpital de kyeshero en vigueur depuis 2015.	Continuité de travail avec le BCZ Rutshuru, l'hôpital de Kyshero en T4. Un protocole avec la sante mentale à Goma pour une prise en chargé psychique des cas compliqués a été signé.
Indicateur de résultat 7.3 : Identification de 486 bénéficiaires par les APS et ou les infirmiers	138 bénéficiaires	126 bénéficiaires Identifiés		Pas d'écart car tous les 39 cas prévus jusqu'au 3 ^{ème} Trimestre ont été identifiés.	Identifier les nouveaux cas à la prochaine période (T4)
Indicateur de résultat 7.4 : Faire les références de 486 cas par les APS et ou les infirmiers	138 cas seront référés en 2017	126 cas référés		Pas d'écart	Poursuivre le référencement des cas en (T4)
Indicateur de résultat 7.5 : Payer les factures pour les soins de santé primaire de 486 bénéficiaires (336 SVS, 60 enfants issus du viol et 90 autres vulnérables) référés par les APS.	138 factures des SSP en faveur des bénéficiaires payées	126 factures des SSP en faveur des bénéficiaires payées		Pas d'écart car le 39 cas ont été pris en charge en SSP en T3	Plaidoyer pour la couverture en charge des cas excédentaires
Indicateur de résultat 7.6 : Faire la contre référence de cas soignés par les infirmiers vers les APS	138 contre - référés	39 cas contre - référés		Pas d'écart, car tout les cas ont été contre-référés.	Faire la contre référence de cas soignés des autres cas soignés

Indicateur de résultat 7.7 : Faire le référencement de cas de fistules à l'hôpital Kyeshero de la 8 ^{ième} CEPAC pour les soins spécialisés.	12 cas des fistules	10cas de fistules		Pas d'écart. Car tous les cas ont été pris en charge prévu et atteint, toute fois il y a eu un excédent de deux cas en 2016.	Après avoir épuisé la ligne Budgétaire prévue, d'autres cas continue d'etre consulter aux CS mais sans appui.
Indicateur de résultat 7.8 : Payer les factures des soins spécialisés de 12 cas des fistules dus au viol.	12 factures payées	10 factures des cas spécialisés		10 cas de fistules pris en charge	La ligne Budgétaire prévue épuisé.
Indicateur de résultat 7.9 : Acheter 6 cartons de kits PEP (trithérapie).	2 cartons de Kit PEP	1 carton de Kit PEP disponibles		1Kit PEP disponible	Le Kit PEP vient d'etre payé en octobre 2017.
Indicateur de résultat 7.10 : Octroi de 6 cartons de Kits PEP au BCZ de Rutshuru Distribution de Kits PEP au CS Kibututu, Buturande et Rubare par le BCZ de Rutshuru.	2cartons de Kit PEP octroyés et distribués aux CS partenaires.	Octroi de 1carton de Kit PEP disponible		1carton de Kit PEP octroyés depuis octobre 2017	La ligne allouée au Kit PEP a été changé en médicament du première nécessite par proposition de la DPS et ZS de Rusthuru. Ainsi, les médicaments ont été octroyés pour bien répondre au besoin ressenti aux CS.
Indicateur de résultat 7.11 : Administration des Kits PEP aux survivant (e)s identifiés et arrivés aux CS ou maisons d'écoute avant 72 heures de l'incident.	130 nombre de dose dans le kit PEP administrées	65 doses de Kit PEP administrées		Les doses du kit PEP administrées.	Administrer les Kit PEP à tout les cas arrivés aux CS avant 72 Heures de l'incident
Indicateur de résultat 7.12 : Assurer le suivi de cas soignés	486 cas	00 cas assurés		Pas d'écart car, le suivi de tout les cas soignés a été assuré	Faire le suivi des autres cas à soigner à la période prochaine.
Indicateur de résultat 7.13 : Elaborer le rapport de suivi de cas.	36 rapports de cas	27 rapports de suivi de cas sur 36 prévus pour toute l'année 2017.		27 rapports de suivi de cas ont été élaborés jusqu'au 4 ^{ème} mois du 2017.	Elaborer d'autres rapports pour la prochaine période
Résultat attendu 8				L'activité est exécutée en	Maintenir le

:l'accompagnement juridique-judiciaire est fourni à 72 survivant(e)s des violences sexuelles dans le Rutshuru d'ici Décembre 2017.			1000 \$	100%	partenariat avec DFJ	partenariat entre AVREO et la Dynamique des Femmes juristes. (DFJ).
Indicateur de résultat 8.1 : Signer le protocole d'accord avec le partenaire DFJ	1 protocole d'accord signé	1 protocole d'accord			1 protocole prévu dans le projet a été signé	Poursuite du partenariat en vigueur.
Indicateur de résultat 8.2: Documenter les cas nécessitant une référence juridique	24 cas enregistrés et référés	4 cas enregistrés et référés			Sur 24 cas à enregistrer et référer pendant 03 Mois,4cas ont été enregistré et référés chez DFJ jusqu'au 3 ^{ème} mois 2017.	Documenter d'autres cas en nécessité et faire le suivi par AVREO
Indicateur de résultat 8.3 : Assurer le suivi des cas auprès de la DFJ	24 cas suivis	4 cas suivi			4 cas de SVS référés ont été suivis	Faire le suivi des cas référés au partenaire(DFJ)
Indicateur de résultat 8.4 : Recevoir la contre référence de la DFJ	24 cas de contre-référence	2 cas de contre-référence			2 sur 24 cas de SVS contre-référés ont été reçu.	Accompagner les cas contre-référés de la DFJ en cours.
Indicateur de résultat 8.5 : Classer les dossiers clôturés et en faire rapport aux partenaires financiers EPER et autres intervenant dans le domaine de lutte contre l'impunité.	24 dossiers clôturés à classer pour 12 mois	00 dossiers classés pour 3 mois			Aucun dossier n'a été classé sur 6 dossiers attendus par trimestre.	Classer les dossiers qui seront attendus à la période suivante.
Indicateur de résultat 8.6: Echanger avec d'autres intervenants.	6 échanges organisés par an.	Pas encore d'échange organisés			Ecart de 6 échanges non encore organisés	Organiser des échanges avec d'autres intervenants pour cette année.
Indicateur de résultat 8.7 : Organiser le suivi de cas référés pour se rassurer de l'évolution de leurs dossiers	12 rapports de suivi	3 rapports de suivi			3 rapports de suivi produits.	Elaborer les rapports des autres cas pour la période suivante.
Indicateur de résultat 8.8 : Produire le rapport de	12 TDR de suivi	3TDR			9 Rapports de suivi des cas sur 12 attendus ont été produit jusqu'au	Produire les autres rapports de suivi

suivi de cas.					3 ^{ème} Trimestre du 2017	pour la prochaine période de rapportage.
Résultat attendu 10: la réinsertion socio-économique est organisée en faveur de 40 bénéficiaires dans le Rutshuru d'ici Décembre 2017.			9018 \$	100 %	Pas d'écart pour se qui était prévu, toute fois après réaménagement en 2017 ; 80 bénéficiaires ont été assistés en AGR.	Assurer le suivi pour meilleur gestion des AGRs.
Indicateur de résultat 10.1 : 20 jeunes identifiés avec photos	20 jeunes à identifier au second trimestre 2017	20 jeunes à identifier au second trimestre 2017			20 Jeunes concernés par l'encadrement seront identifiés au second trimestre 2017	A poursuivre au second trimestre 2017
Indicateur de résultat 10.2 : 20 jeunes orientés	20 jeunes	20 jeunes			20 Jeunes concernés par l'encadrement par an	
Indicateur de résultat 10.3 : Formation en briqueterie organisée	45 séances de formation	45 séances de formation			27 séances jusqu'au troisième trimestre 1016.	Continuité de Suivi des activités en 2017
Indicateur de résultat 10.4 : Formation en menuiserie	2 centres loués et équipés	2 centres loués et équipés			45 séances jusqu'au troisième trimestre 2016.	Continuité de Suivi des activités en 2017
Indicateur de résultat 10.5: 2 Centres d'apprentissage loués et équipés pour la formation des bénéficiaires	2 kits achetés	2 Kits achetés			Tous les 2 centres d'apprentissage prévus par le projet ont été loués et équipés	Continuité de Suivi des activités en 2017
Indicateur de résultat 10.6 : les kits achetés	10 jeunes reçoivent les kits du groupe	10 jeunes ont reçu les kits du groupe			Les Kits ont été achetés juste après et octroyés aux jeunes.	Continuité de Suivi des activités en 2017
Indicateur de résultat 10.7 : 20 jeunes reçoivent les kits du groupe	5 jeunes installés dans les sites de briqueterie	5 jeunes ont été installés dans les sites de briqueterie			10 jeunes ont reçu les Kit du groupe.	
Indicateur de résultat	5 jeunes	5 jeunes ont			5 jeunes installés.	

10.8 :10 jeunes installés dans les sites de briqueterie	installés dans les sites de menuiserie	été installés dans les sites de menuiserie	X			
Indicateur de résultat 10.9 : suivi des activités assuré	72 suivis assurés	54 suivis assurés.	X		54 suivis ont été assurés pour jusqu'au 1ère trimestre	Continuité de Suivi des activités en 2017
Indicateur de résultat 10.10 : suivi des activités assuré	12 rapports produits	9 rapports produits	X		9 rapports de suivi produit	Continue à produire le rapport de suivi
Résultat attendu 9: Au moins 36 visites de suivi sont effectuées par AVREO ,12 visites de suivi formatif par le Bureau pays et 6 visites par le siège EPER	X	X	540\$	200%	Ecart positive	Le nombre de visite est monte à la hausse car le chef de bureau et la secrétaire caissière ont fait aussi des descentes sur terrain. Effectuer d'autres visites de suivi pour le reste de la période (T4)
indicateur de résultat 9.1 : 36 TDR de suivi élaborer par AVREO	12 TDR de suivi	9TDR	X		Tous les TdR de suivis prévus pour le T3 ont été élaboré par AVREO	Elaborer d'autres TdR pour la prochaine période (T4)
Indicateur de résultat 9.1 : Au moins 36 visites de suivi sont effectuées par AVREO,	Effectuer au moins 12 visites de suivi par AVREO en 2017.	9 suivis des activités effectués.	X		Il n'y a pas d'écart.	D'autres visites seront effectuées aux prochains trimestres du 2017.
indicateur de résultat 9.2 : 12 Visites de suivi formatif par le Bureau Pays	Mener 4 Visites de suivi formatif par le Bureau Pays en 2016.	1 visite effectuée par le Bureau pays	X		1 visite de suivi formatif sur 4 visites prévu d'où un écart de 3 visités.	Les visites restantes seront organisées au prochain trimestre.
indicateur de résultat 9.3 : 6 Visites par le siège EPER, durant la vie du projet.	2 Visites à organiser par le siège EPER en 2017.	Zéro visite organisée par le siège EPER.	X		Aucun visite a été organise pendant les 3èmes trimestres	Organiser la visite prévue à d'autres trimestres en 2017.
Résultat attendu 10 : Au moins 2 revue annuelles	X	X	00\$	00 %	Cette revue a été organisée en janvier 2016.	La revue annuelle a été réalisée en

d'activités organisée en janvier 2015 et Janvier 2016, 1 Evaluation finale organisée et commanditée par EPER à la fin du projet (Décembre 2017)						janvier 2016.
indicateur de résultat 10.1: Au moins 2 revues annuelles d'activités organisées en janvier 2016 et 2017	1 revue annuelle prévue en 2016.	1 revue annuelle organisée.			Il n'y a pas d'écart, car la revue annuelle planifiée a été organisée.	Réaliser une autre revue annuelle en janvier 2017.
Indicateur de résultat 10.2: 1 Evaluation finale organisée et commanditée par EPER à la fin du projet (Janvier 2018)	1 évaluation finale prévue en 2017.	1 évaluation finale organisée.			Il n'y a pas d'écart.	Rapport d'évaluation non encore rendu disponible.
Résultat attendu 11: Au moins 3 Audits externes sont réalisés pour certifier les comptes et dépenses du projet.			00 \$	00 %	Ce montant a été transféré en 2015 comptant pour le 4 ^{ème} Mois dans la demande de fonds trimestrielle car cette activité a été réalisée au début de l'année 2016.	Cette activité a été réalisée au début de l'année 2016.
Indicateur de résultat 11.1: 1 Audit externe est réalisé pour certifier les comptes et dépenses du projet en janvier 2016.	1 audit prévu en 2016.	1 audit réalisé.			Ce montant a été transféré en 2017, mais comptant pour l'exercice 2016 car cette activité a été réalisée au début de l'année 2016.	Cette activité a été réalisée au début de l'année 2016.
indicateur de résultat 11.2: 1 Audit externe est réalisé pour certifier les comptes et dépenses du projet en janvier 2017.	1 audit prévu en 2017.	1 audit sera réalisé en 2017.			Pas d'écart car cette activité a été réalisée au début de l'année 2017.	Cette activité a été réalisée au début de l'année 2017.
indicateur de résultat 11.3: 1 Audit externe est réalisé pour certifier les comptes et dépenses du projet en Janvier 2018.	1 audit prévu en 2018.	1 audit sera réalisé en 2018.			Ce montant sera transféré en 2018, car cette activité sera réalisée au début de l'année 2018.	Cette activité sera réalisée au début de l'année 2018.

3. PROCESSUS

IDÉES ISSUES DES ESPACES D'APPRENTISSAGE ANNUELS DE L'HEKS/EPER

Idées de l'/des espace(s) d'apprentissage [Nom(s)] apportées à l'/aux espace(s) d'apprentissage [Nom(s)]	Que vous révèlent ces idées sur votre PP (en termes d'opportunités/de défis) dans les domaines suivants ?	Opportunités	Défis	Décisions de pilotage/actions à adopter pour améliorer la mise en œuvre du PP	Responsabilité / date limite
Mesurer l'impact des séances de sensibilisation, émission radio et séances d'échange en focus groupe sur le changement de comportement de la population	Pertinence des théories du changement du PP / projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staff qualifié, ✓ Population active, ✓ Radio plus écouté, ✓ Staff intégré dans la société, ✓ Population qui accepte de témoigner, ✓ Récouter des histoires de succès auprès de la population bénéficiaires, ✓ Engagement des jeunes pour continuer des sensibilise d'autres jeunes pour renforcer les messages, reçus pendant les séances de focus groupe, émission radio et sensibilisation. ✓ Réduction sensible de cas de barbarie sur les violences sexuels 	<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance d'autres acteurs dans le domaine de lutte contre le violence sexuelle dans le milieu, • Rayon d'action large et vaste, • Les autorités non implique dans le plaidoyer, • Incapacité médiatique de la radio pour arroser toute l'étendue du rayon d'action, • Radio souvent avec des pannes techniques, • Staff et OB limité par rapport au nombre de la population 	<ul style="list-style-type: none"> -Solliciter l'augmentation budgétaire pour élargir les activités et la prise en charge des nouveaux jeunes désœuvrés ; -Mener un plaidoyer auprès d'autres organisations pour la couverture dans le milieu et l'appui du nouveaux cas ; - Appuyer techniquement la radio en fin de mieux couvrir toute l'entendue (zone d'intervention) 	-AVREO avec appui d'EPER d'ici 2017.

	Évolution du contexte (y compris concernant les risques)	- les activités d'identification et d'enregistrement se poursuivent grâce à l'implication et le courage des agents affectés à ces tâches (APS).	Insuffisance de moyen de transport pour l'atteinte des coins reculés dans le milieu. Et aussi assurer rapidement le déplacement des APS.	Rien à signaler	AVREO avec l'appui d'EPER Suisse.
	Gestion du portefeuille (BuCo et partenaires)	Les moyens pour l'assistance holistique en faveur des bénéficiaires sont disponibles.	Le montant mis à la disposition de la PEC holistique couvre l'effectif prévu qui s'avère insuffisant.	Allouer le moyen susceptible de couvrir les besoins ressentis.	AVREO en collaboration avec le Bureau Pays.
	Degré d'atteinte des objectifs du PP et des projets	60 personnes identifiés et enregistrés pour ce trimestre par les staffs affectent au projet.	-Certains bénéficiaires n'ont pas été atteints à temps par les staffs a cause d'un rayon d'action plus vaste et d'instabilité sécuritaire dans leur milieu (de provenance).	Identifier, enregistrer et réinsérer les cas ayant été atteint dans maisons d'écoute et centre de sante	AVREO
	Pertinence des approches de travail des projets et du PP	L'écoute et l'assistance apportée en faveur des bénéficiaires.	Insuffisance d'une logistique en vivre pour le SVS et d'autres bénéficiaires nécessitant l'hébergement dans les Maisons d'écoute.	Majorer le montant alloué pour la restauration des bénéficiaires hébergés dans la maison d'écoute	AVREO sous l'appui du Bureau Pays.

ANNEXES

1. PHOTOS



Formation sur la Gestion des stress et débriefing émotionnel Formation sur la Masculinité Positive



Formation sur les AGR

Photo de famille entre les staffs AVREO et CACDI après la formation Gestion des stress et débriefing émotionnel et la transformation des conflits.



Focus group sur la M P : Roue d'égalité



Focus group avec les jeunes : Transformation des conflits



Sensibilisation des élèves : la Non violence

2. HISTOIRE DE SUCCES



Moi, KAVIRA CHUVA, âgé de 56ans veuve et mère des six enfants.

Je suis veuve depuis 10ans , habitat à Kinyandoni, j'ai été victime d'une violence sexuelle par deux des hommes armés, quant l'information est arrivée à la maison d'écouté de Kinyandoni, un agent d'AVREO est allé me récupérer chez moi à la maison et m'avait amené au centre de sante de Kinyandoni pour les soins, et, là j'ai réussi un bon traitement de la part des infirmières. Pendant que, j'ai recevais le traitement la maman conseillère aussi me prodigue beaucoup de conseils qui mon aide à s'intégré dans la société.

J'ai compris que derrière, elle, il y avait une équipe des agents qui travaillent sous le nom d'une association dénommée AVREO, quant j'avais reçu une somme de Cents dollars (100\$) pour une activité de commerce dans notre village de Kinyandoni. Avec cette somme, j'avais commencé à tisser les nattes et sac ou gibecières, et, cela aussi ma d'etre membre d'une caisse villageoise dénommée UPENDO dans notre village. Maintenant, j'ai résolus la scolarisation de mes enfants qui vont à l'école et pour cette année tous mes six enfants fréquentent l'école.

Comme membre de la caisse villageoise d'épargne et crédits, je peux recevoir un crédit pour résoudre un problème dans ma famille. Etant veuve, mes enfants partent des bons habits et peuvent manger deux fois par jour. C'est pourquoi, je prends ce courage d'exprimer mes sincères remerciements à l'organisation AVREO et son bailleur des fonds EPER SUISSE.




*Je m'appelle **Victorine NAGAHOZE**, âgée de 71ans, résidant à Rubare, Territoire de Rutshuru en Province du Nord – Kivu en RD Congo.*

Etant abandonné par mon marie pour avoir été victime d'une violence sexuelle par les bandits qui n'ont pas été identifié, malgré mon âge avancée qui n'a plus plaisir avec les hommes ; ainsi mon mari a quitté notre foyer. Je loue grandement le seigneur qui m'avait envoyé l'organisation AVREO pour prendre en chargé les soins de santé au centre de santé de Rubare.

Trouvant que ma situation sanitaire été très compliquée et sans amélioration, avec le concours du centre de santé de Rubare et l'organisation AVREO, j'ai été amené à Goma à l'hôpital de la 8^{ème} CEPAC Kyshero pour une opération chirurgicale sans savoir qui donnait l'argent pour les soins, la restauration, etc.

Chez suis rentrée chez moi à la maison seule malgré les multiples séances des médiations faites par une conseillère d'AVREO à Rubare. Une grande surprise encore est que, AVREO m'a donné Cents dollars (100\$) pour la réinsertion économique, alors j'avais payé un hectare de champs, maintenant ceux qui des maris à Rubare, viennent demander service et à la fin de la saison de leur récolté, je reçois quelque chose de leur récolte pour ma sur vie, entre autres de la nourriture et de l'argent.

Je remercie vivement les infirmiers qui mon soigne, l'organisation AVREO et leur patron pour songer aux personnes abandonnées avec leur mari avec une âgée avancée, et, mais aussi aux multiples conseils qui m'a permis d'etre valorise dans notre village.

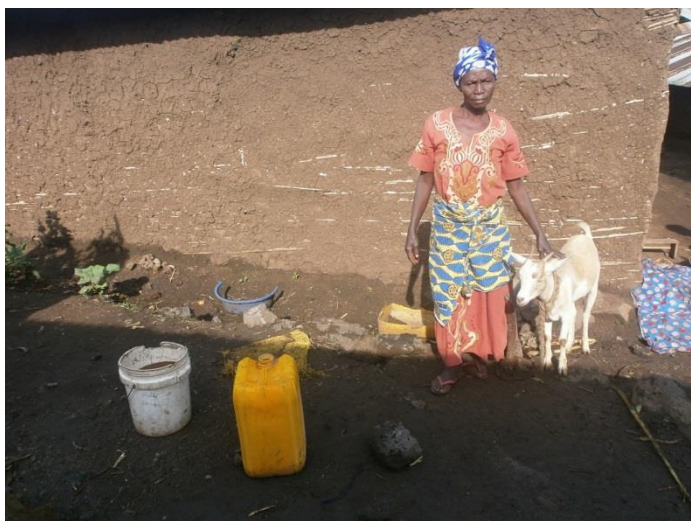

*Je réponds au nom de **KAHINDO ALEXANDRINE**, âgée de 56 ans, Veuve et victime des Violences Sexuelle dans le village de Rubare en 2016 par des hommes armés non identifiés.*

Après avoir été assisté par les conseillères et infirmières qui mon pris en chargé pour les soins au centre de santé de Rubare et m'intégré facilement dans la société, j'ai réussi un fonds de l'ONG AVREO pour le petit commerce, j'avais seulement une chèvre mais après avoir réussi cette somme de Cents bollards (100\$) j'ai payé encore une autre chèvre et aussi je fais le petit commerce des braises. Avec ce petit commerce des braies, j'assure à payer les frais scolaires des mes enfants et je me sens sans tellement de problème. J'espère que mes deux chèvres, après avoir mis bat, m'aiderons d'avantage à résoudre d'autres problème et sur tout à faire étudié mes enfants.

Sur ce, je remercie vivement AVREO et son bailleur des fonds pour les soutiens a ma famille. Que Dieu bénisse AVREO !



*Je réponds au nom de **KABUO Georgette** âgé de 22 ans ;
orpheline du père et de la mère, mère d'un enfant.*

*Au mois d'Aout 2017, j'ai reçu un fond pour la réinsertion
économique pour soutenir mon petit commerce, j'avais seulement 40 \$
comme capital et je vendais le savon de lessive (omos) et parfois
j'abandonnais l'activité. Alors, depuis que cet argent m'a été donné (100\$),
j'achète plusieurs marchandise et mon activité s'est épanoui et je vends
maintenant la viande de porcs et les tomates. Je réalise un peu de bénéfice
dans chaque article.*

*Mon mari et moi qui n'avaient pas l'emploi / occupation nous
sommes souvent ensemble pour vendre nos articles / marchandise et je ne
connais plus le problème de rupture. Je suis très contente car je suis
toujours ensemble avec mon mari, en plus nous résolvons tous ensemble les
problèmes de notre ménages en gardent le capital intact, notre vision est
d'avoir un jour une petite boutique à partir de ce montant reçu auprès des
hommes de Dieu par l'entremise d'EPER SUISSE et son partenaire
AVREO. Parfois j'allais manger chez la belle – mère mais aujourd'hui
c'est elle qui fait recours à nous.*

Sincèrement, je remercie encore plus AVREO et EPER SUISSE pour cet acte combien louable

Fait à Goma, le 06 Octobre 2017

- Préparé par IGNACE LUANDA / Chargé de Projet ;
- Lu et approuvé par Janvier KABWE/ Coordinateur.
